




COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA

0,00%

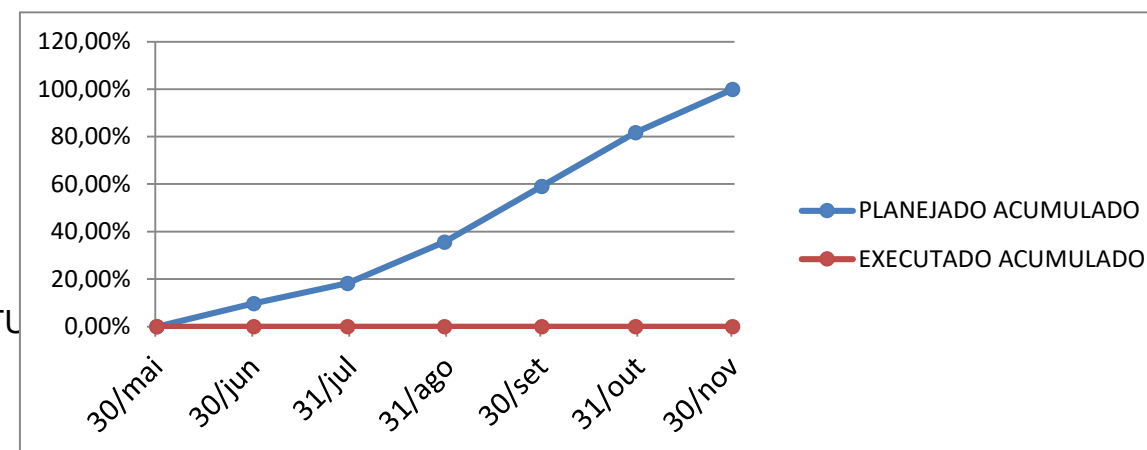


CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO(REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARUARU)

INÍCIO (O.S.)		30/mai	30/jun	30/jul	30/ago	30/set	30/out	30/nov
			MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
DATA DAS MEDIÇÕES (REALIDADE)		30/mai						
% EXECUTADO NO PERÍODO		0,00%						
DATA DAS MEDIÇÕES (PLANEJADO)		30/mai	30/jun	30/jul	30/ago	30/set	30/out	30/nov
PLANEJADO ACUMULADO		0,00%	9,74%	18,19%	35,69%	59,13%	81,82%	100,00%
EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PLANEJADO MENSAL		0,00%	9,74%	8,44%	17,50%	23,43%	22,69%	18,18%
			R\$73.846,58	R\$63.990,30	R\$132.654,93	R\$177.596,14	R\$171.968,24	R\$137.804,51
DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º	2º	3º	4º	5º	10º
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.668,48	5.200,27	5.893,64	5.893,64	5.893,64	5.893,64	5.893,64
	Executado até a última medição:	0,00%	15,00%	32,00%	49,00%	66,00%	83,00%	100,00%
			15,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%
2.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 226,50	226,50	-	-	-	-	-
	Executado até a última medição:	0,00%	100,00%					
			100,00%					
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 34.509,62	34.509,62	-	-	-	-	-
	Executado até a última medição:	0,00%	100,00%					
			100,00%					
4.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 9.916,08	4.462,24	1.983,22	1.983,22	991,61	495,80	-
	Executado até a última medição:	0,00%	45,00%	65,00%	85,00%	95,00%	100,00%	
			45,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 17.300,54	3.460,11	8.650,27	5.190,16	-	-	-
	Executado até a última medição:	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%			
			20,00%	50,00%	30,00%			
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 42.376,22	4.237,62	16.950,49	12.712,87	4.237,62	4.237,62	-
	Executado até a última medição:	0,00%	10,00%	50,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
			10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
7.0	VEDAÇÕES	R\$ 15.026,49	-	1.502,65	6.010,60	6.010,60	1.502,65	-
	Executado até a última medição:	0,00%		10,00%	50,00%	90,00%	100,00%	



0,00%
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA

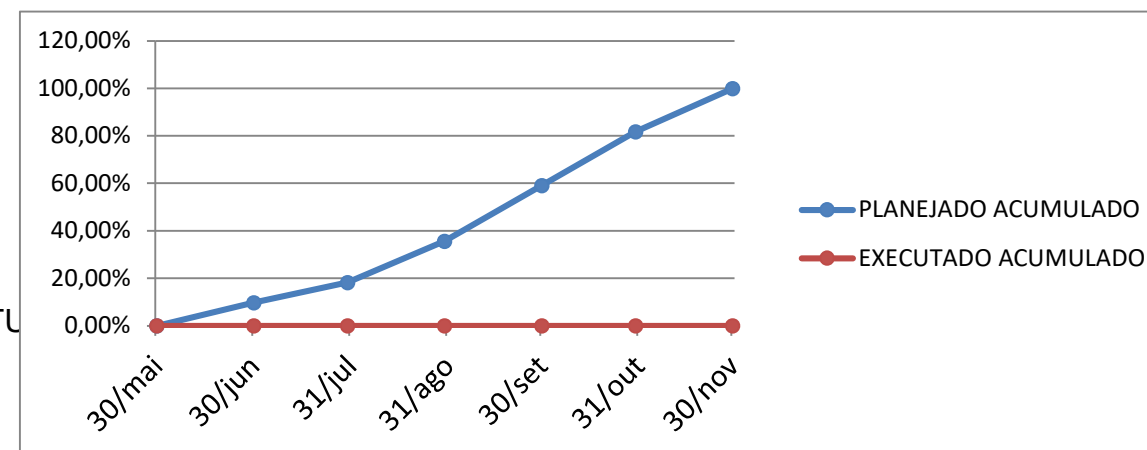


CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO(REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARUARU)

INÍCIO (O.S.)			30/mai	30/jun	30/jul	30/ago	30/set	30/out	30/nov
8.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 20.107,55		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%		
	Executado até a última medição:	0,00%	1.005,38	3.016,13	5.026,89	5.026,89	3.016,13	3.016,13	
			5,00%	20,00%	45,00%	70,00%	85,00%	100,00%	
			5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%	
9.0	COBERTURAS	R\$ 23.825,26	-	-	4.765,05	11.912,63	4.765,05	2.382,53	
	Executado até a última medição:	0,00%			20,00%	70,00%	90,00%	100,00%	
					20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	
10.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 67.307,80	-	-	13.461,56	20.192,34	20.192,34	13.461,56	
	Executado até a última medição:	0,00%			20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
11.0	REVESTIMENTOS	R\$ 73.997,82	-	-	14.799,56	22.199,35	22.199,35	14.799,56	
	Executado até a última medição:	0,00%			20,00%	50,00%	80,00%	100,00%	
					20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
12.0	FORRO	R\$ 16.629,79	-	-	-	1.662,98	9.977,87	4.988,94	
	Executado até a última medição:	0,00%				10,00%	70,00%	100,00%	
						10,00%	60,00%	30,00%	
13.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E G	R\$ 16.976,84	848,84	5.093,05	5.941,89	3.395,37	1.697,68	-	
	Executado até a última medição:	0,00%	5,00%	35,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			5,00%	30,00%	35,00%	20,00%	10,00%		
14.0	INCÊNDIO	R\$ 1.308,48	-	-	-	-	-	1.308,48	
	Executado até a última medição:	0,00%						100,00%	
								100,00%	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICAS	R\$ 64.586,91	3.229,35	6.458,69	12.917,38	29.064,11	6.458,69	6.458,69	
	Executado até a última medição:	0,00%	5,00%	15,00%	35,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
			5,00%	10,00%	20,00%	45,00%	10,00%	10,00%	
16.0	EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA	R\$ 7.172,33	-	-	-	3.586,17	3.586,17	-	
	Executado até a última medição:	0,00%				50,00%	100,00%		
						50,00%	50,00%		
17.0	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	
	Executado até a última medição:	0,00%							
18.0	SONORIZAÇÃO	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	
	Executado até a última medição:	0,00%							



COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA

0,00%

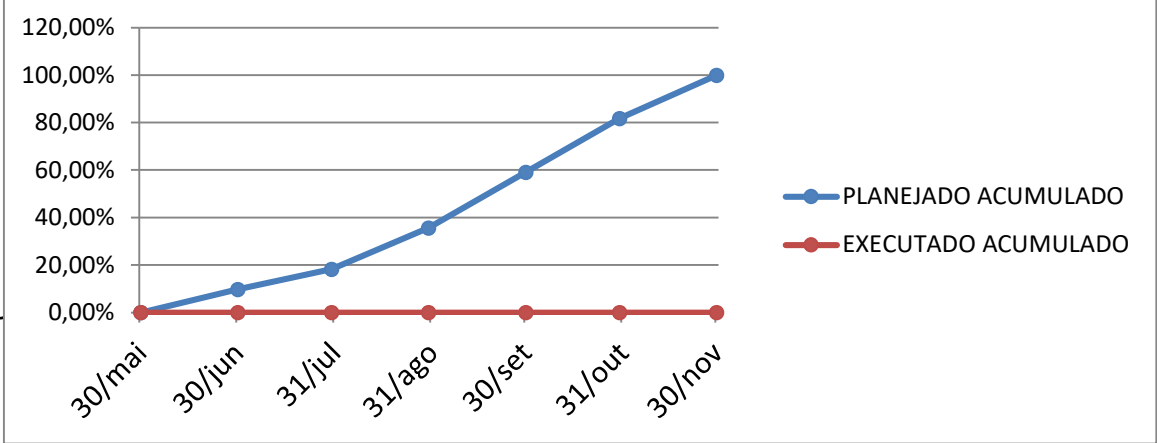

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO(REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CARUARU)

INÍCIO (O.S.)			30/mai	30/jun	30/jul	30/ago	30/set	30/out	30/nov
19.0	ESQUADRIAS	R\$ 46.709,40	-	-	14.012,82	14.012,82	18.683,76	-	-
	Executado até a última medição:	0,00%			30,00%	60,00%	100,00%		
					30,00%	30,00%	40,00%		
20.0	APARELHOS E METAIS	R\$ 15.743,60	-	-	-	4.723,08	4.723,08	6.297,44	-
	Executado até a última medição:	0,00%				30,00%	60,00%	100,00%	
						30,00%	30,00%	40,00%	
21.0	DRENAGEM	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-
	Executado até a última medição:	0,00%							
22.0	SERRALHARIA E MARCENARIA	R\$ 23.023,73	-	-	-	4.604,75	11.511,87	6.907,12	-
	Executado até a última medição:	0,00%				20,00%	70,00%	100,00%	
						20,00%	50,00%	30,00%	
23.0	PINTURA	R\$ 10.142,29	-	-	-	-	4.056,92	6.085,37	-
	Executado até a última medição:	0,00%					40,00%	100,00%	
							40,00%	60,00%	
24.0	SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 9.470,93	-	-	-	-	2.841,28	6.629,65	-
	Executado até a última medição:	0,00%					30,00%	100,00%	
							30,00%	70,00%	
25.0	JARDINAGEM E LIMPEZA	R\$ 1.582,71	-	-	-	-	474,81	1.107,90	-
	Executado até a última medição:	0,00%					30,00%	100,00%	
							30,00%	70,00%	
26.0	EQUIPAMENTOS - MAQUINÁRIO	R\$ 34.207,48	-	-	-	-	6.841,50	27.365,98	-
	Executado até a última medição:	0,00%					20,00%	100,00%	
							20,00%	80,00%	
TOTAL DA OBRA s/ BDI		R\$ 586.816,85							
TOTAL DA OBRA c/ BDI		R\$ 757.860,70							
